


MODULE 6: Hiện thị dự án theo một số yêu cầu- Report

- MS Project cho phép hiển thị các task trong dự với các cách khác nhau như:

Calendar	Lịch hàng tháng chỉ ra các công việc và khả năng hoàn thành nó.
Gantt Chart	Diễn tả các công việc và các thông tin có liên quan, một biểu đồ (biểu đồ ngang) thể hiện các công việc và thời gian hoàn thành chúng.
Network Diagram	Thể hiện dưới dạng lưới các công tác (sơ đồ mạng) và sự phụ thuộc giữa chúng. Dùng khung nhìn này để có một cái nhìn bao quát về các công việc.
Task Usage	Thể hiện danh sách các công việc đã được gán tài nguyên. Dùng khung nhìn này để thấy nguồn nguồn lực nào đã được gán cho một công việc cụ thể
Tracking Gantt	Thể hiện danh sách của công việc và thông tin có liên quan. Dùng khung nhìn này để theo dõi tiến trình của dự án.
Resource Graph	Thể hiện biểu đồ phân phối tài nguyên. Dùng khung nhìn này để thể hiện thông tin về một nguồn lực dưới các tiêu chí khác nhau.
Resource Sheet	Danh sách nguồn lực và thông tin liên quan. Dùng khung nhìn này để nhập và hiệu chỉnh các thông tin về tài nguyên.

- Tab View: Hiện thị và cho phép lọc theo các tham số khác nhau

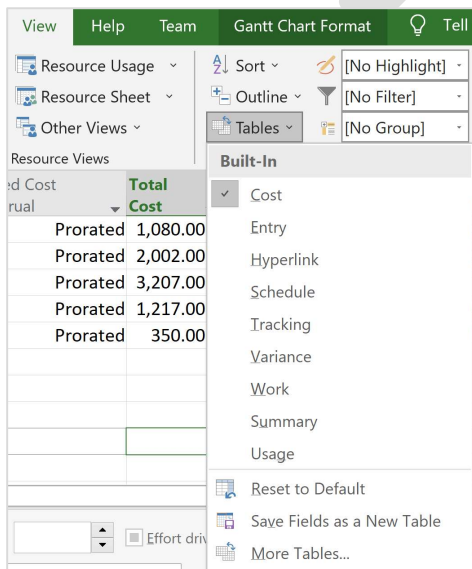

Thể hiện các giá trị cần lọc

Hiện thị dự án theo chi phí

Hiện thị dự án toàn bộ dự án

Hiện thị dự án theo lịch thực hiện

Theo dõi toàn dự án

Hiện thị dự án theo tổng các work thực hiện

- So sánh các giá trị Cost, Baseline, Variance, Actual

Work: Thời gian thực hiện theo các tham số hiện tại.

Baseline: Thời gian thực hiện công việc theo kế hoạch.

Variance: Khoảng thời gian thay đổi giữa thực tế và kế hoạch.

Actual: Thời gian thực tế đã thực hiện được theo các tham số hiện tại.


Remaining: Thời gian thực tế còn lại.

%W. Coml: Số phần trăm công việc đã thực hiện.

- Xuất các báo cáo (Report) cho dự án

1. Báo cáo theo đồ thị:

Tab Report → Visual Reports

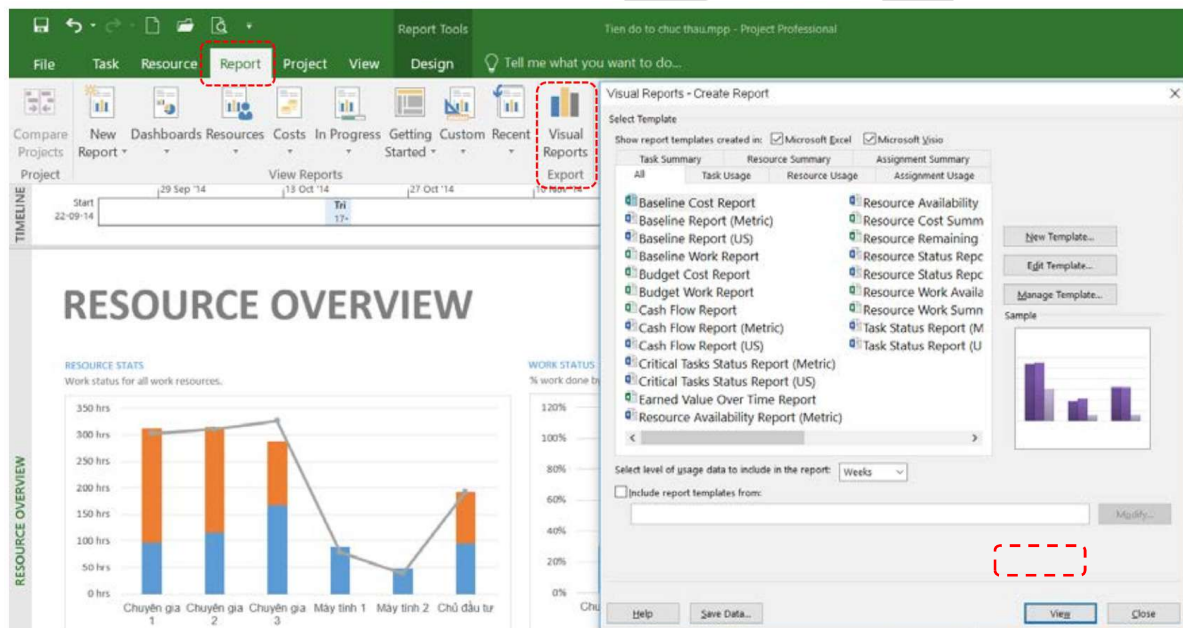

2. Báo cáo cơ bản dạng số liệu

Tab Report → View Group

Resource	Report	Project	View	Help	Team	Gantt Chart Format	Tell me what you want to do
Dashboards	Resources	Costs	In Progress	Getting Started	Custom Recent	Visual Reports	Export
Task Name	Start	Finish	Baseline Start	Baseline Finish	Start Var.	Finish Var.	Add New
Thu thập yêu cầu	18/10/2021	25/10/2021	NA	NA	0 days	0 days	
Phân tích thiết kế	26/10/2021	16/11/2021	NA	NA	0 days	0 days	
Viết chương trình	05/11/2021	25/11/2021	NA	NA	0 days	0 days	
Kiểm thử	26/11/2021	03/12/2021	NA	NA	0 days	0 days	
Triển khai	06/12/2021	06/12/2021	NA	NA	0 days	0 days	

Task Name	Duration	
Khảo sát	2 days	Bùi Hoàng Quyên, Thuế[20.00 đ]
Phân tích	4 days	Framework[1], Lê Lan Phương[200%], Chi phí đi lại[5.00 đ]
Thiết kế	7 days	OS[2], Trần Ngọc Hà
Xây dựng	0.5 mons	Trần Ngọc Hà, Hardisk[0.5]
Kiểm thử	1 wk	Hoàng Mạnh Quân (PM), Thuế[10.00 đ]
Chuyển Giao	4 days	Lê Hoàng Minh (TV)[50%], Mai Hà Linh, Chi phí công tác[100.00 đ]
Hướng dẫn sử dụng	3 days	Phạm Minh Vương (TV), Chi phí đi lại[10.00 đ]

Resource Name	Type	Material Label	Initials	Group	Max. Units	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use
Hoàng Mạnh Quân (PM)	Work		H		100%	10.00 đ/hr	0.00 đ/hr	20.00 đ
Lê Hoàng Minh (TV)	Work		L		50%	20.00 đ/hr	0.00 đ/hr	10.00 đ
Phạm Minh Vương (TV)	Work		P		200%	15.00 đ/hr	0.00 đ/hr	30.00 đ
Lê Lan Phương	Work		L		100%	15.00 đ/hr	0.00 đ/hr	10.00 đ
Hoàng Lê Minh	Work		H		100%	10.00 đ/hr	0.00 đ/hr	0.00 đ
Mai Hà Linh	Work		M		100%	15.00 đ/hr	0.00 đ/hr	10.00 đ
Trần Ngọc Hà	Work		T		200%	15.00 đ/hr	0.00 đ/hr	10.00 đ
Bùi Hoàng Quyên	Work		B		100%	15.00 đ/hr	0.00 đ/hr	10.00 đ
OS	Material		O			250.00 đ		0.00 đ
Hardisk	Material		H			120.00 đ		0.00 đ
USB	Material		U			1.00 đ		0.00 đ
Framework	Material		F			80.00 đ		2.00 đ
Chi phí đi lại	Cost		C					
Chi phí công tác	Cost		C					
Thuế	Cost		T					
